十勝圏複合事務組合
中間処理施設建設工事進捗状況報告

2025 年 10 月 24 日
第 1 回　一般廃棄物処理施設整備検討会議　資料 1

進捗　大型不燃ごみ処理の中核を担う破砕機基礎を打ち終えました

令和 7 年 10 月時点では、工場棟の地下部の掘削から配筋、型枠及びコンクリート打設までを概ね終え最深部のごみピット及び灰ピットについては壁面のコンクリート施工が終わった箇所から順次埋め戻しを進めました。この一連の躯体工事に合わせて大型のプラント機械設備である蒸気タービン発電機及び高速回転破砕機の基礎コンクリート工事を進め後者は 8 層目までの全数を打ち終えました。

地上 1 階床レベルでは、捨てコン打設に合わせてプラント鉄骨工事に必要となるアンカーフレームの据付を進め、マットスラブの施工を順次進めております。工場棟以外については振興局との協議結果を踏まえ構内道路工事を進めるため、関連するロードヒーティング工事とも必要な調整を行い全体工程に遅れが生じないよう工事を進捗させております。

施工　地下部の埋め戻しと地上工事を進めております

施設の深部に相当するごみピット及び灰ピット底盤のコンクリートを打ち終え現在は立ち上がり壁部分のコンクリート打設を進め順次埋め戻しを行っております。同時に床部のマットスラブを施工しプラント鉄骨の施工に必要となるアンカーフレームの据付を進めております。

写真１　ごみピット壁コンクリート打設及び灰ピット埋め戻し

写真２　１階アンカーフレーム据付状況及び全景

写真３　１階マットスラブ施工状況

安全　実施報告

本工事では月次で職長等を招集し安全衛生協議会を開催しております。帯広市で発生した死亡事故の教訓に加え、本工事は大規模かつ長期工事であることから、如何なる状況においても救護を可能とするため救助装置訓練をはじめとした実践的な安全教育も進めております。

写真５　安全大会及び救助装置訓練
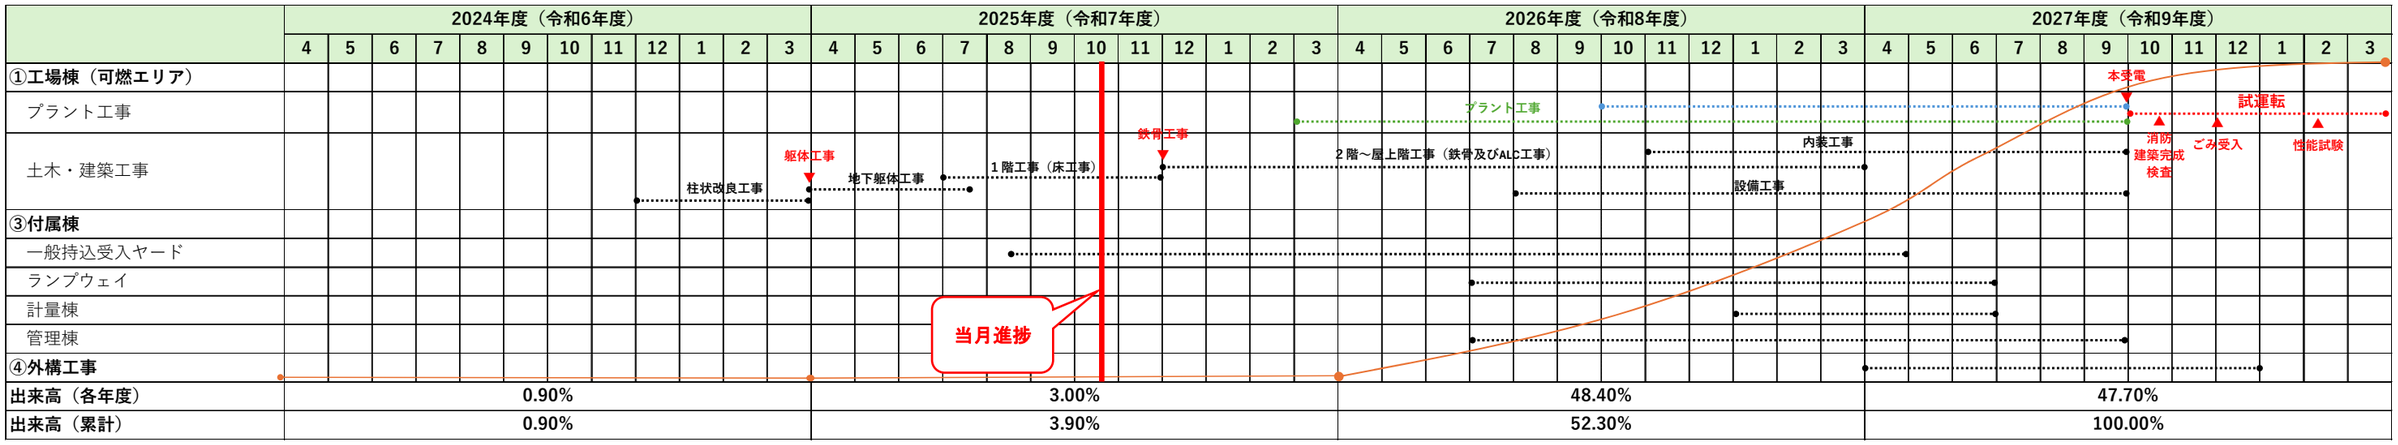
工程　天候にも恵まれ、大きな遅れなく順調に進捗しております
